



Agenda 26ste VAP-overleg A9 Gaasperdammerweg

1. Opening mededelingen en rondje langs de wijken
2. Stand van zaken afwikkeling bouwschades
3. Stand van zaken werkzaamheden IXAS en voorlopige scenario's openstellen tunnel
4. Stand van zaken werkzaamheden IXAS en voorlopige scenario's openstellen tunnel
5. Planning openstellingsfasering
6. Invulling Park
7. Openingsfestival
8. Punten eerder ter tafel gekomen
9. Volgend overleg
10. Rondvraag



1. Opening, mededelingen en rondje langs de wijken



1. Mededelingen

- Uitnodiging is niet helemaal goed gegaan
 - Verplaatst, maar niet iedereen was op de hoogte
 - Gemeente Amsterdam te laat uitgenodigd
 - Agenda niet afgestemd
 - Losse eindjes stonden niet op agenda



1. Mededelingen

- Voorstel/herbevestiging
- 1. Bij eventuele wijzigingen wordt datum benoemd en niet alleen per vergaderverzoek verspreid;
- 2. Gemeente Amsterdam standaard in uitnodiging;
- 3. Agenda vroegtijdig afgestemd met Lony
- 4. Presentatie en acties na overleg toegestuurd
- 5. Eventuele losse eindjes mee in agenda nieuw overleg



1. Mededelingen

- Gerti den Dekker heeft zich afgemeld



2. Stand van zaken schadeafhandeling

– Actueel aantal schadegevallen:	243	(was 243)
– Aantal nieuw in 2018/2019	41	(was 41)
– Aantal nieuw in 2020	0	
– Aantal x second opinion aangevraagd:	42	(was 40)
– Aktes van kwijting opgesteld:	186	(was 182)
– Aktes van kwijting uitbetaald:	177	(was 169)
– Aantal dossiers gesloten:	197	(was 193)

Voorbeeld:

- | | | |
|--|---|---------|
| – Openstaande “oude dossiers” Nieuw Kemperling | 4 | (was 5) |
|--|---|---------|
- 3 daarvan wachten op resultaat second opinion
 - 1 loopt niet meer omdat geen normaal contact mogelijk is




3. Stand van zaken werkzaamheden IXAS



4. Stand van zaken werkzaamheden IXAS

- Werkzaamheden dit jaar

Hittewerende bekleding

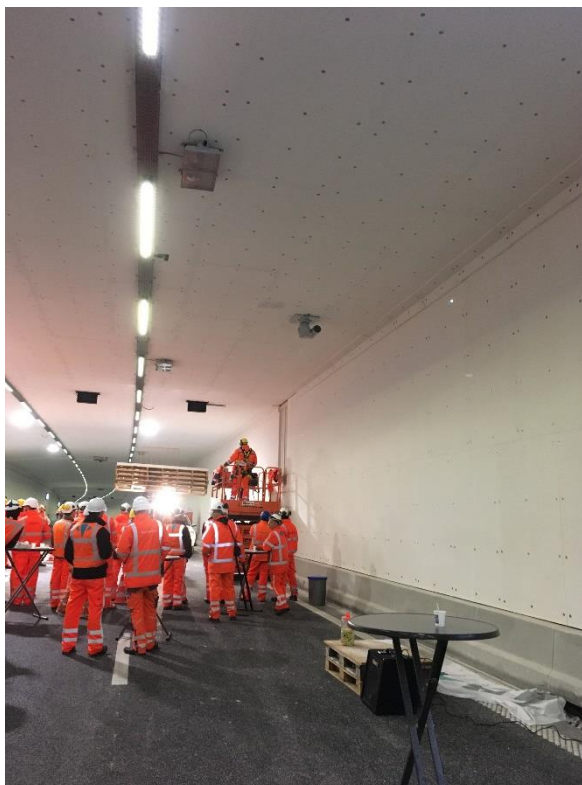

In vijf buizen is de hittewerende bekleding aangebracht.

Eind oktober is de laatste plaat gemonteerd.

285.000 m2 Promatect platen
1.000.000 gaatjes boren
10 maanden werk (januari - oktober)
24 uur per dag werken

Tunneltechnische installaties



De technische installaties worden volop getest.

We voeren nu de integrale testen uit.

Ook met auto's die door de tunnel rijden.

Aanbrengen bitumen op dak



Het aanbrengen van bitumen duurt veel langer dan verwacht


Dak is helemaal schoongeborsteld

Op veel plaatste bitumen al aangebracht.

In maart gaan we weer verder




Tussen spoorlijn en Huntum

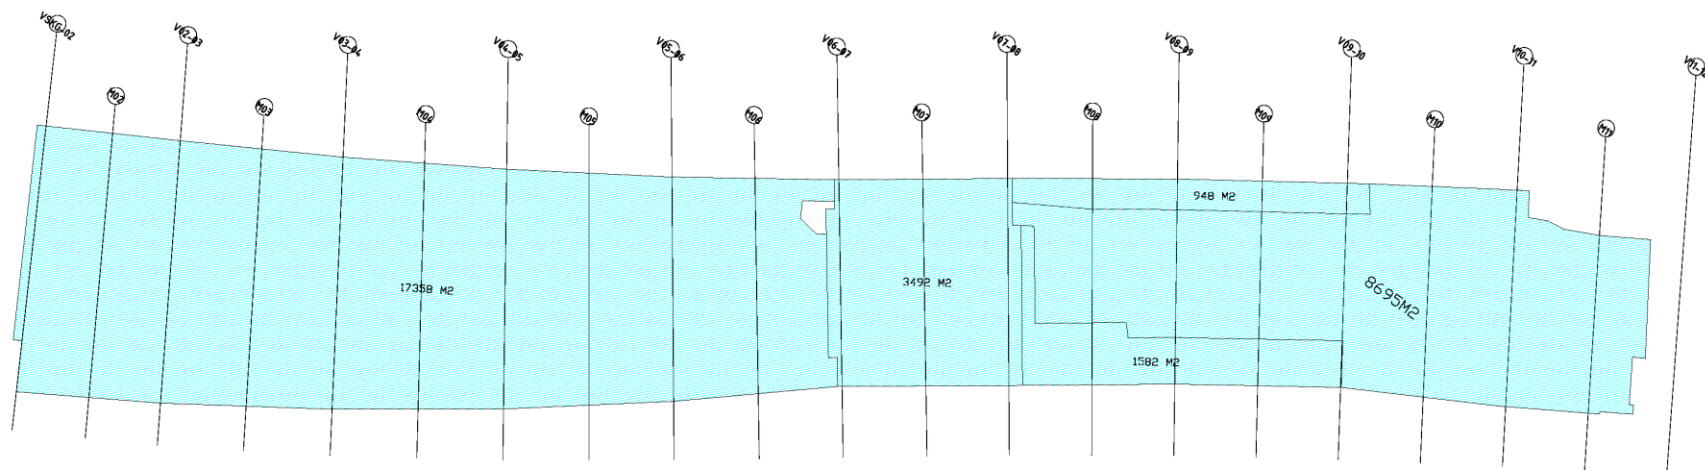





Tussen Huntumdreef en afrit Gooiseweg

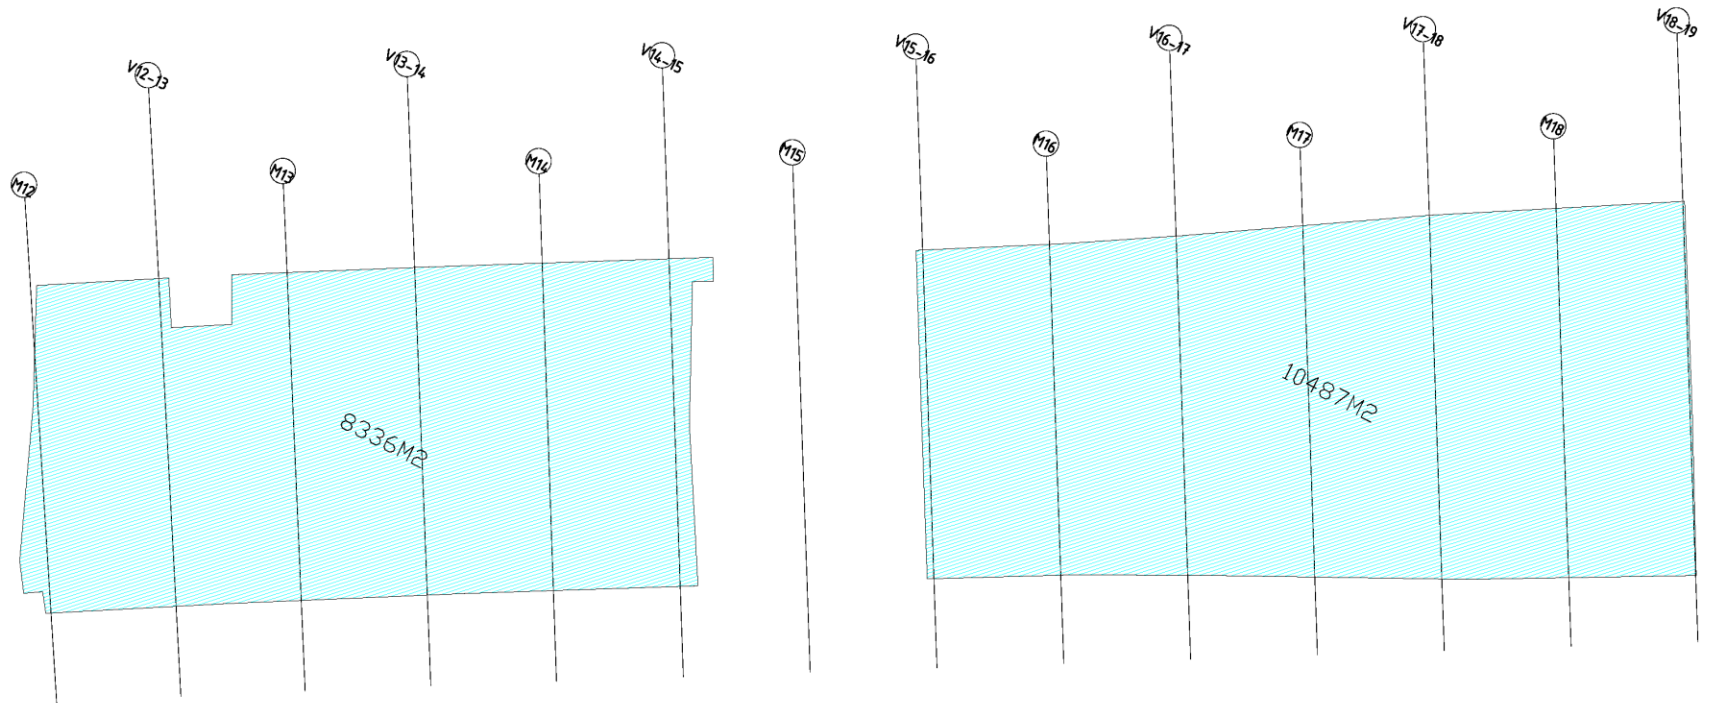

Tussen oprit Gooiseweg en metrospoor

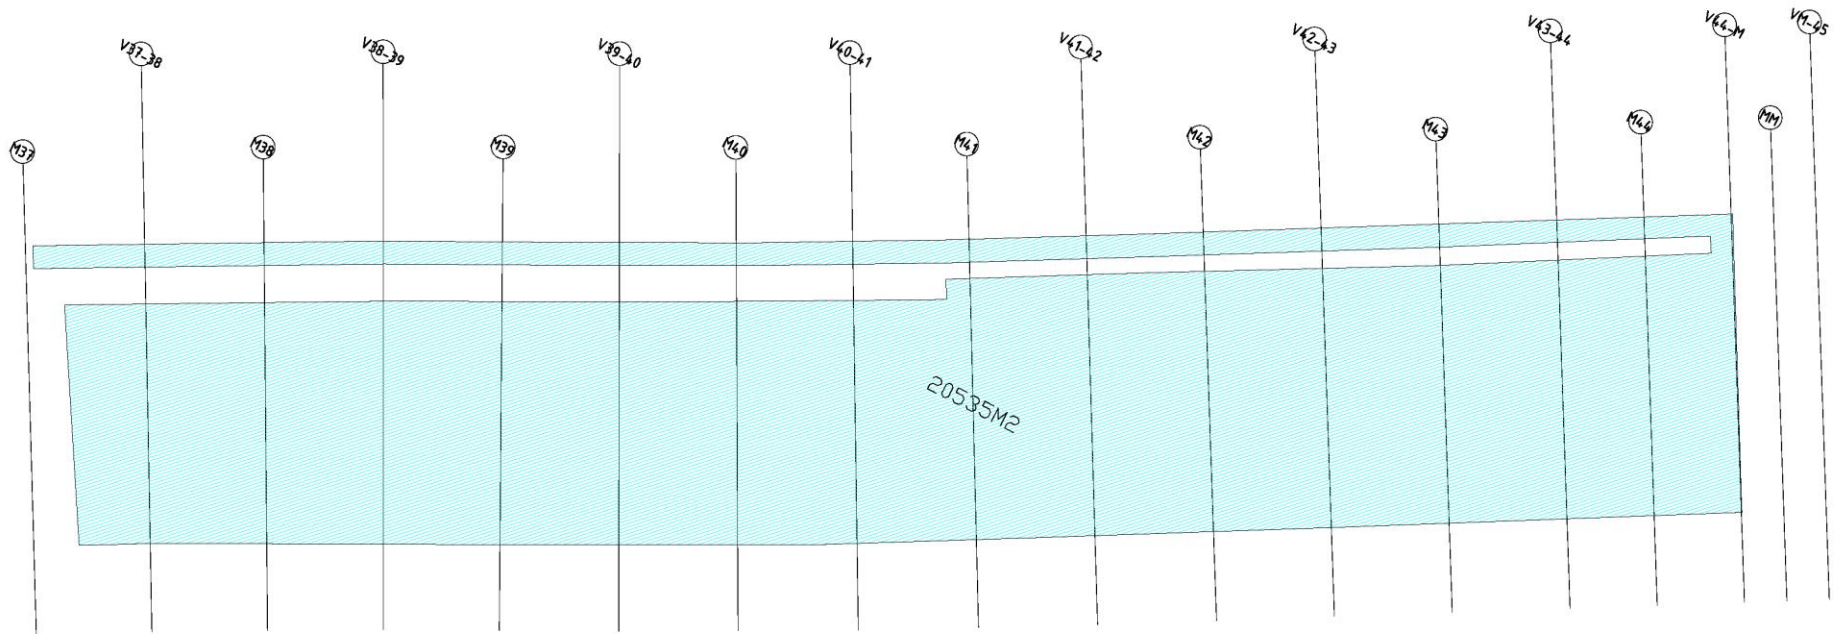


Tussen metrospoor en Kouwenoord

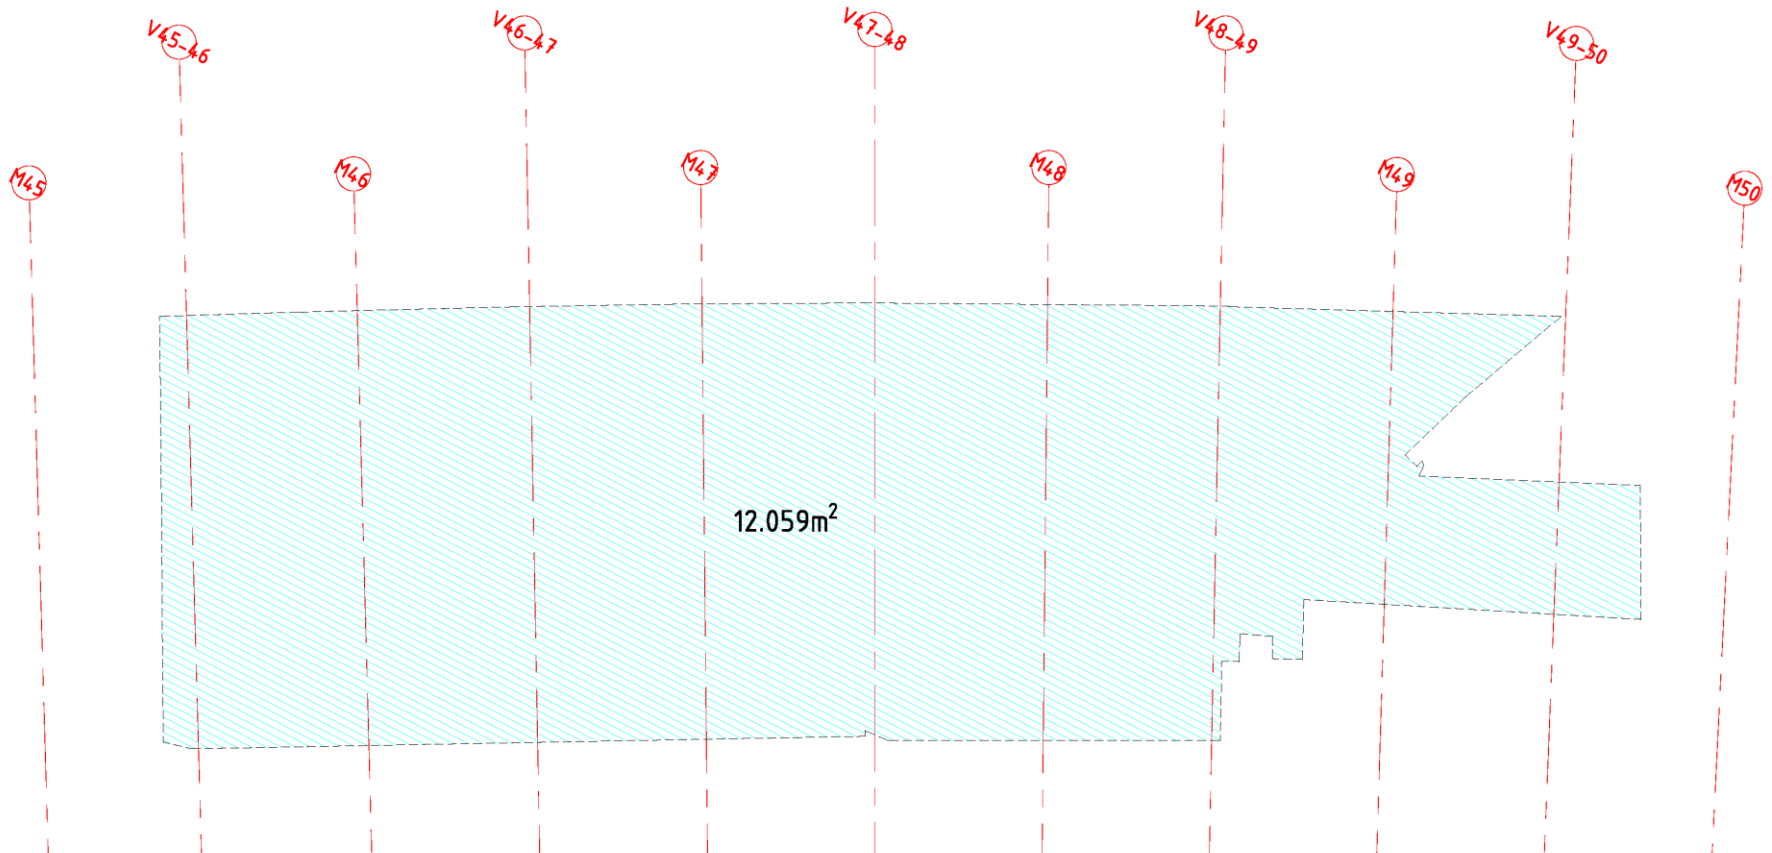



Ter hoogte van Kantershof

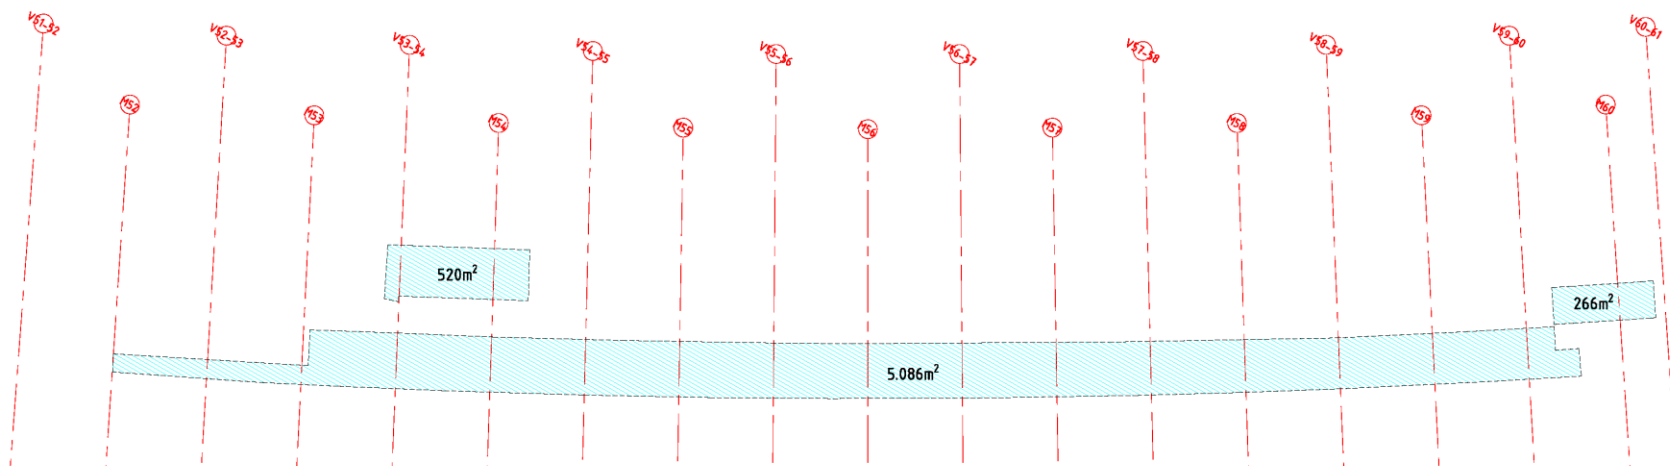

Geluidsscherm Kantershof



Bodem bij
geluidsscherm
Kantershof wordt
niet stabiel

Oplossing damwand
van ca. 100 m. langs
het talud in de grond
drukken

Start medio maart
Werk duurt ongeveer
6 tot 8 weken

Onderhoud A9




In week 14 (april)
onderhoud op de A9

We sluiten steeds 1
kant van de A9 af
voor het verkeer:




Parkbruggen

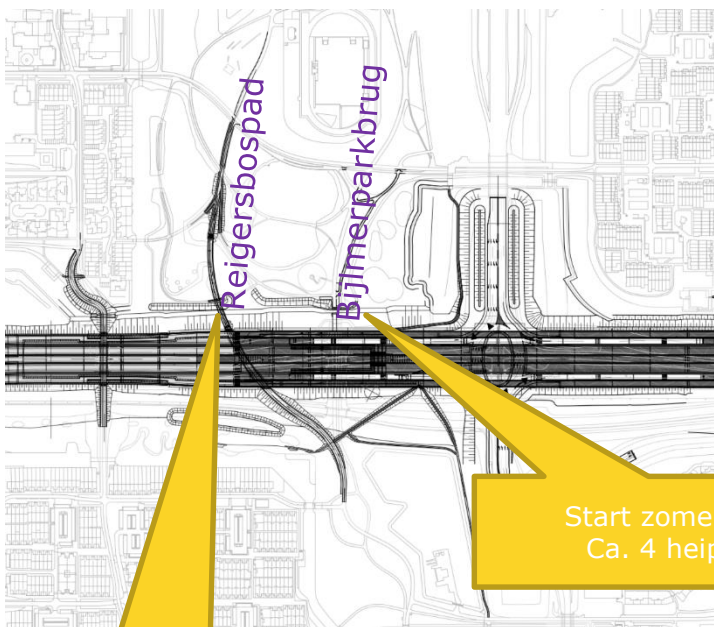

Start eind april 2020
Ca. 12 heipalen
en 4 buispalen

Start zomer 2020
Ca. 4 heipalen

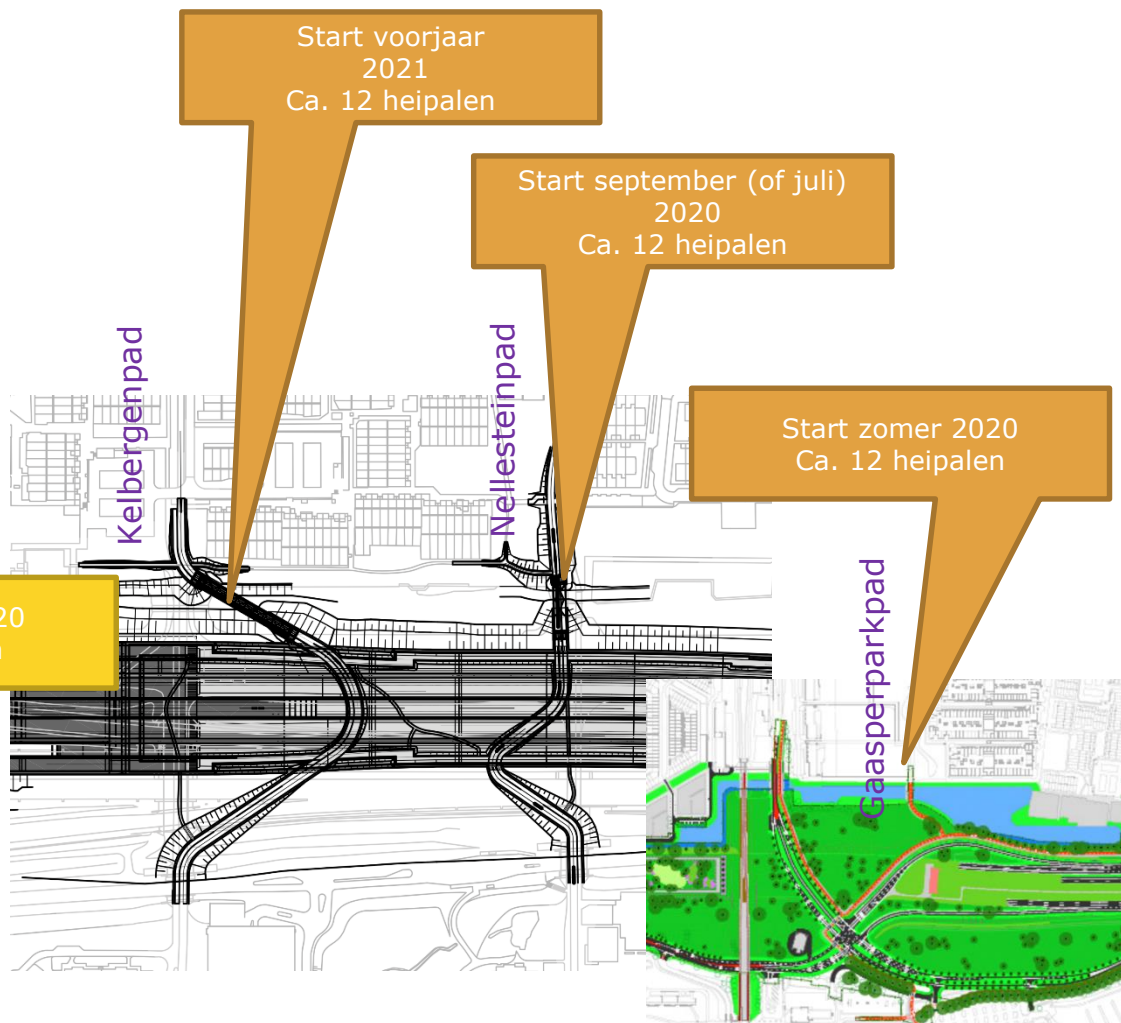


Start voorjaar
2021
Ca. 12 heipalen

Start september (of juli)
2020
Ca. 12 heipalen

Start zomer 2020
Ca. 12 heipalen

Aanpassen kruising Langbroekdreef - Gooiseweg

Stap 3

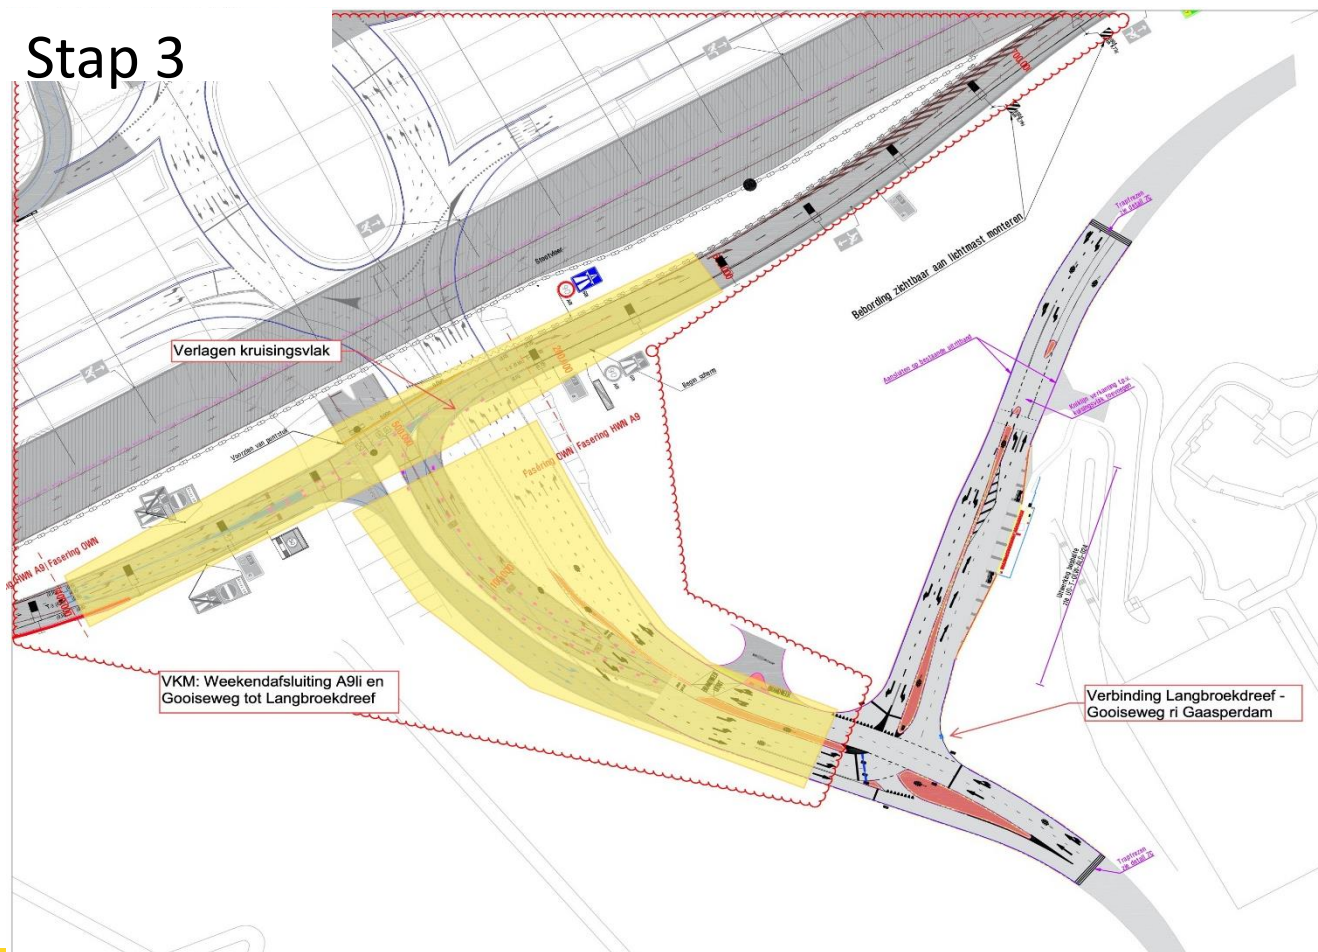

Vanaf mei

Aanpassen kruising een aansluiting op Gooiseweg.


Bewonersavond voor Nellestein




Openstelling van de tunnel 2020

Fase 1

Ingebruikname tunnel Fase 1

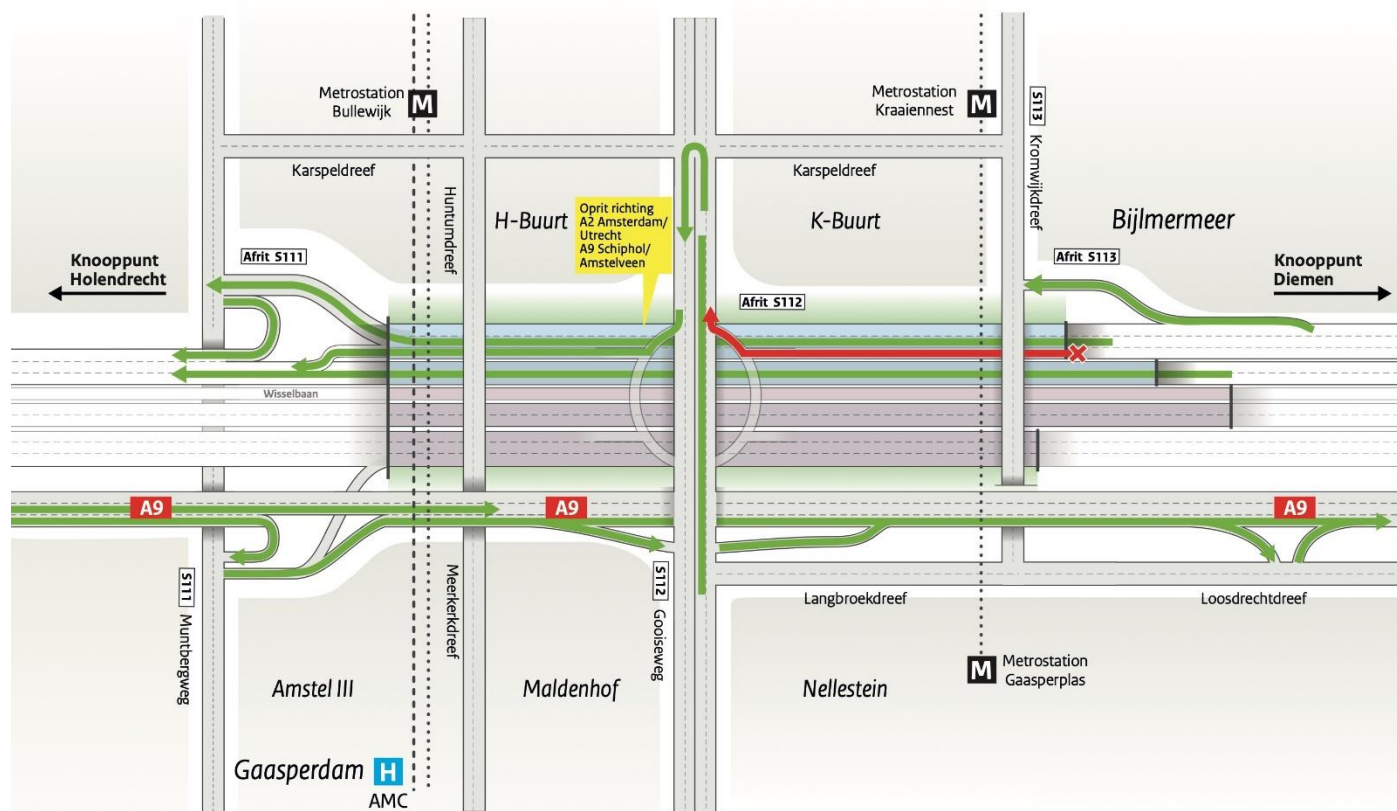

Werkzaamheden vanaf voorjaar 2020

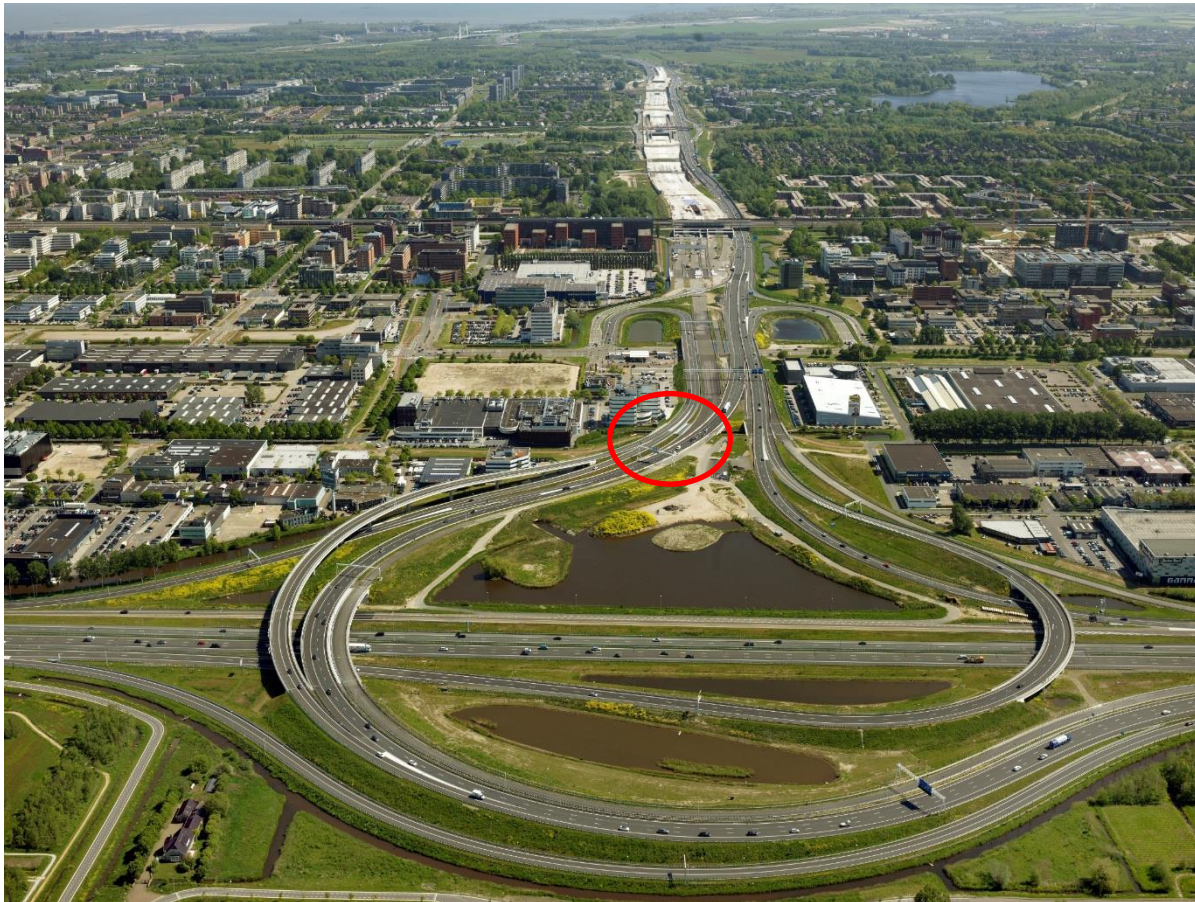

Viaduct
Lemelerbergpad
afbouwen

De randen van het
viaduct worden
afgewerkt

Geen hinder

Werkzaamheden vanaf voorjaar 2020



Laatste dek van
viaduct
Haarlerbergpad
bouwen (voor
zuidelijke
parallelrijbaan)

Ca 22 heipalen
43 liggers

Afsluitingen
fiestpad



Werkzaamheden vanaf voorjaar 2020



Afbouwen
zuidelijk deel
brug over de
Gaasp

Voegen
maken,
randen
afwerken

Zorgt voor
geluid



Werkzaamheden vanaf voorjaar 2020




Tunnelwand
hoofdrijbaan
zuid

Vorbereiding
nieuwe
kruising



Openstelling van de tunnel 2020

Fase 2

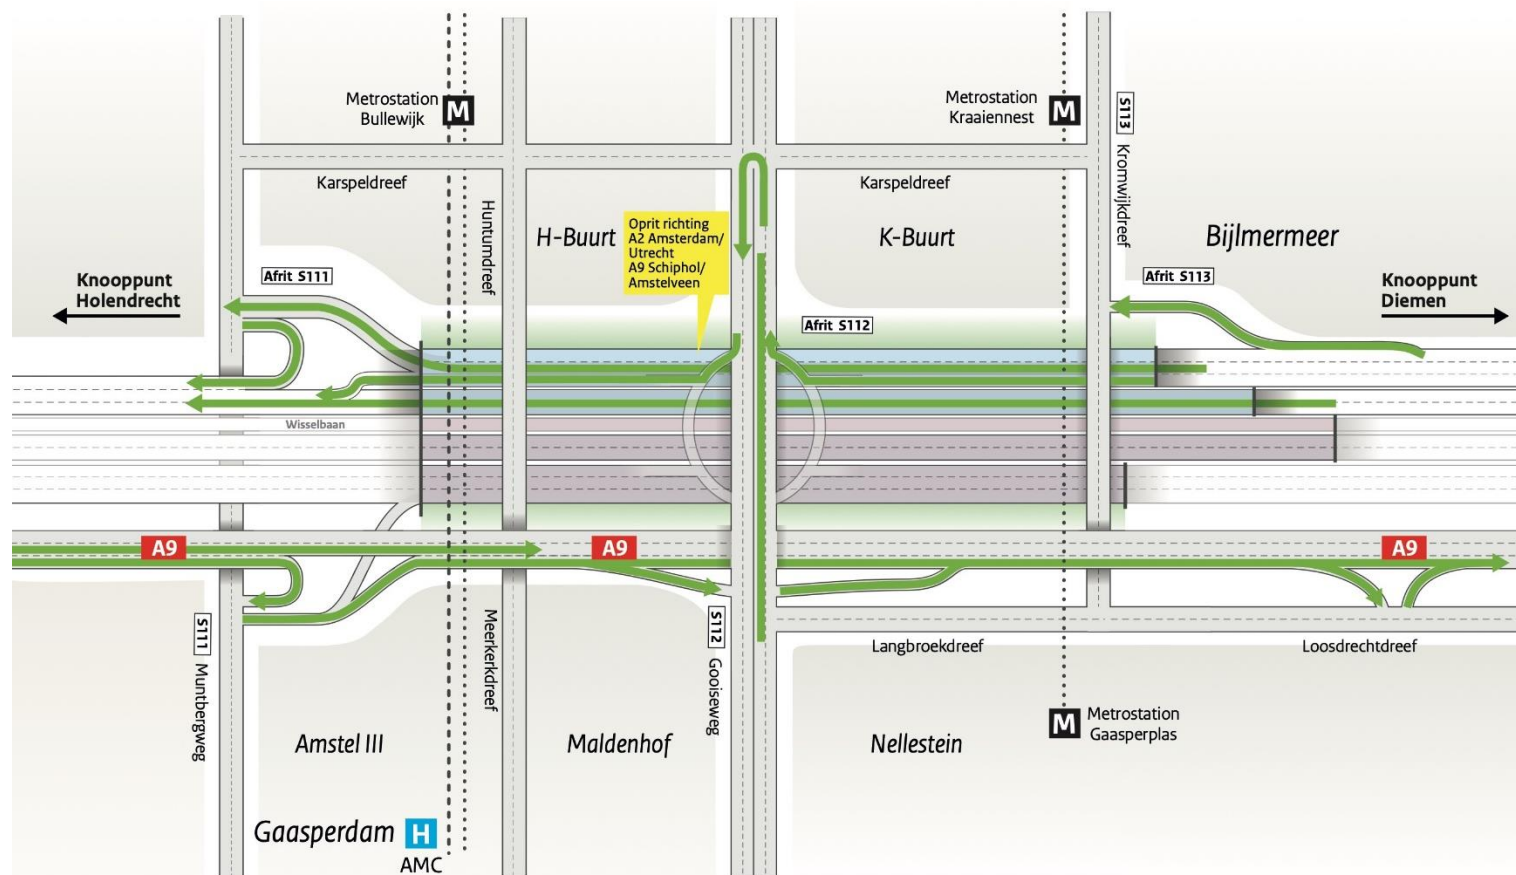




Openstelling van de tunnel 2020

Fase 3

Ingebruikname tunnel Fase 3

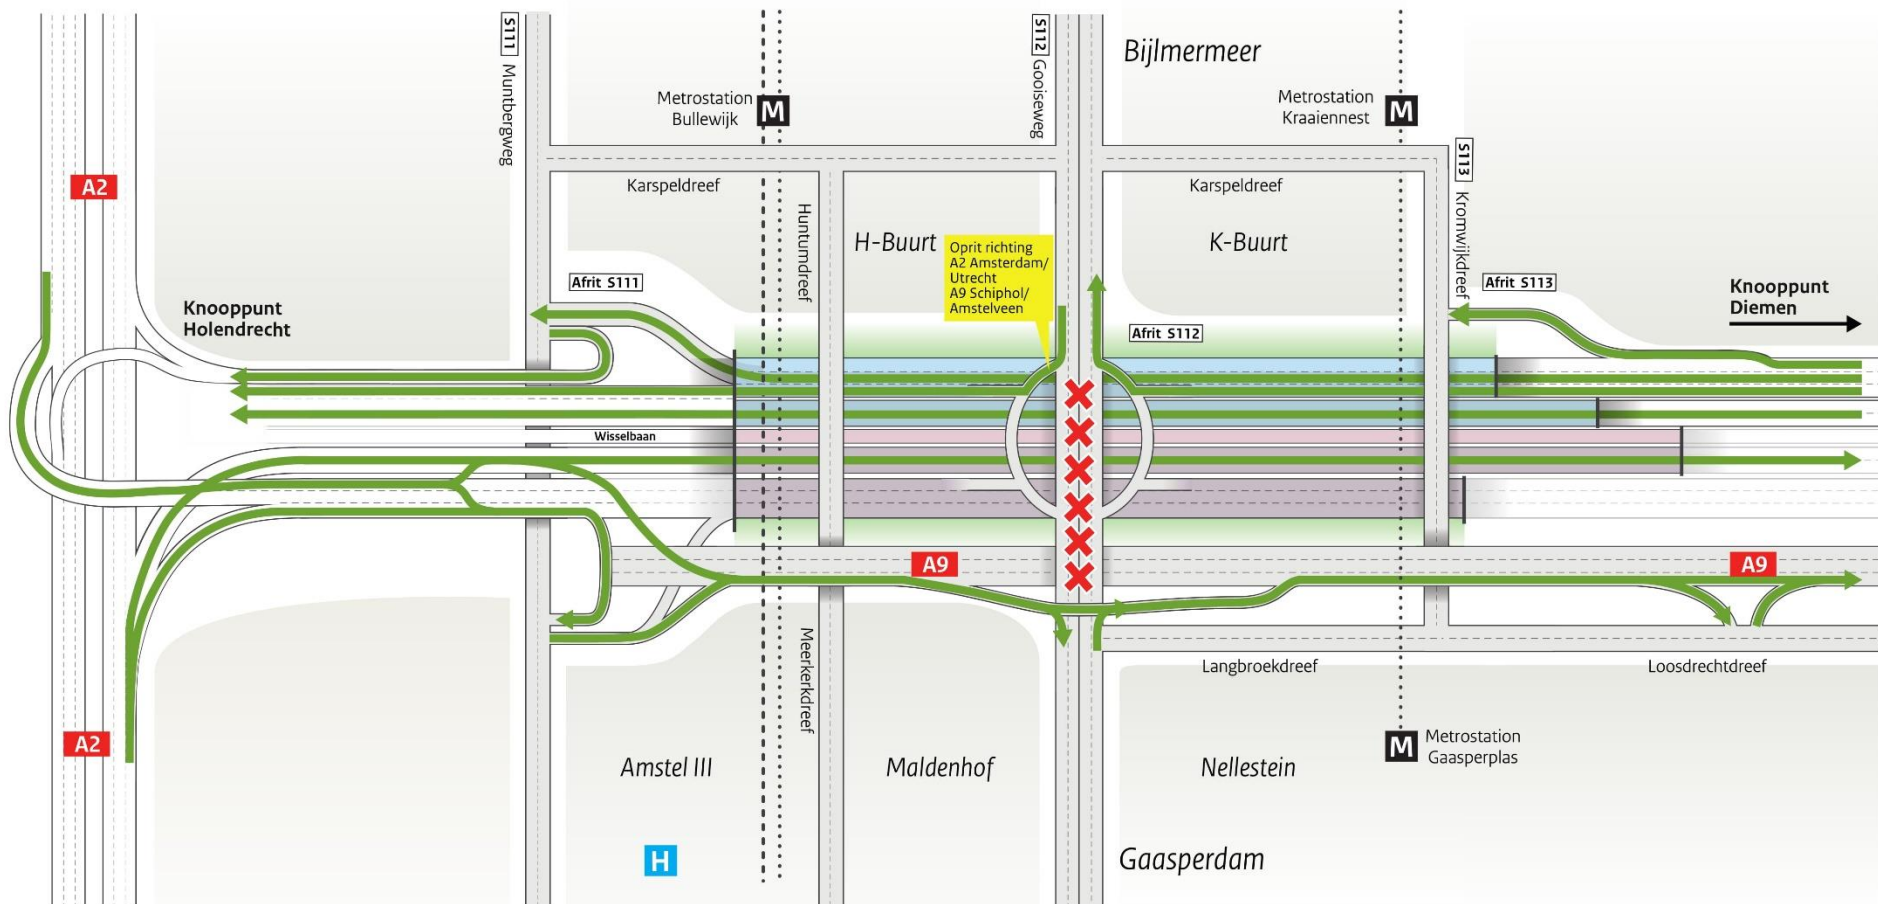

Werkzaamheden vanaf voorjaar 2020



Bouw ovonde in
Gooiseweg

Gooiseweg 7
weken dicht ter
hoogte van de
tunnel.

Op- en afritten
blijven open


Verkeershinder:
aanpassing
verkeerslichten
Karspeldreef en
communicatie



Openstelling van de tunnel 2020

Fase 4

Ingebruikname tunnel Fase 4

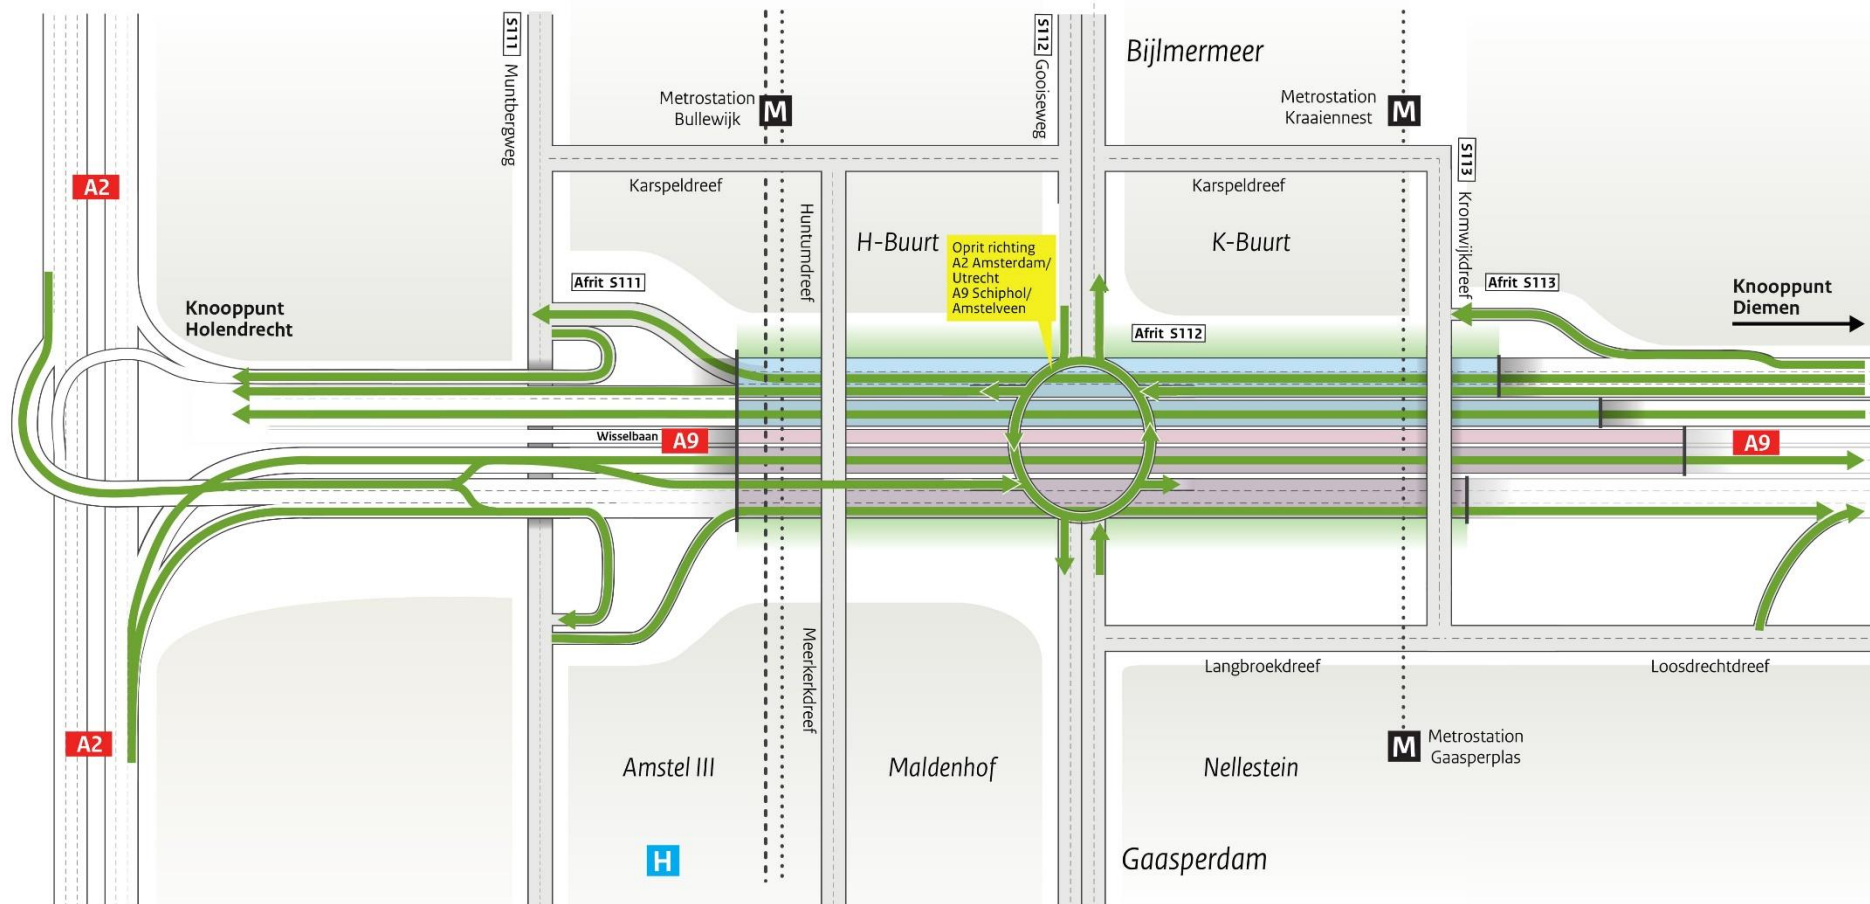

Sloop oude A9



Frezen en
afvoeren asfalt

Afvoeren zand

Sloop viaducten

Delen worden al
ontmanteld
vanaf eerste
openstelling
maar overgrote
deel na vierde
fase.

Werkzaamheden vanaf 2021



Vorbereiding nieuwe
kruising
Loosdrechtdreef/
Kromwijkdreef/
Langbroekdreef



5. Openstellingsfasering

- Deze week laatste testen TTI
- Aanvraag openstellingsvergunning half februari 2020
- Eerste openstellingsweekend mei 2020
- Laatste openstellingsweekend oktober/november 2020



Bereikbaarheid tijdens fasering

- Uitgangspunt: balans tussen verkeershinder en omgevingshinder
- IXAS en RWS zetten verkeersmaatregelen in, zoals tekstkarren bij omleidingsroutes en instelling VRI Karspeldreef
- Informeren bedrijven/omwonenden
- Informatiebijeenkomst Amsterdam Zuidoost
- Informatiebijeenkomst Nellestein
- Overleg met AMC en IKEA



6. Invulling park op tunnel

- Gemeente Amsterdam werkt plan voor participatie proces uit
- Verkennend wordt verplaatsen sportvelden Strandvliet. Dient net als alle andere initiatieven als input voor participatieproces.



7. Openingsfestival

- Zaterdag 18 april 2020 van 10.00 tot 16.00
 - Openingsrun
 - Fietsen door de tunnel
 - Selfie tour
 - Rondleiding
 - Tijdlijn
 - Muziek
 - Catering



8. Punten eerder ter tafel gekomen

- Definitieve verlichting onder het viaduct Muntbergweg
- Hellingspercentages fietspaden
- Vergroening van de tunnelmonden bij de Gaasp
- Weerkaatsen geluid geluidsscherm Kantershof
- Trilgeluiden bij tunnels (Roertunnel, voegovergangen)



9. Volgend overleg

- 31 maart / 1 april informatiebijeenkomsten
- 18 april openingsfestival
- Volgend overleg..?

10. Rondvraag

